

LE JOURNAL DE CHANTIER



HUMAN'ISA XXIII

Du 13 au 19 Mars



Jour 15

Lundi 13 Mars

MÉTÉO

Grand soleil ! 32 °C

PROGRAMME

Ça y est nous entamons la semaine de transition entre le gros œuvre et le second œuvre !

La journée commence par un grand nettoyage général du chantier, de la base vie et des outils.

On termine de coffrer et de couler les murs pignons et de découper les solives manquantes ! D'ailleurs, une équipe s'attaque à la pose des pannes.

Un élément vient motiver les troupes : la livraison des panneaux sandwich pour la toiture. Normalement, à la fin de la semaine, le bâtiment sera hors d'eau !

Une équipe de 8 personnes motivées reste sur le chantier toute la nuit pour poser les dernières pannes et un maximum de solives.

AU MENU

Haricots rouges, spaghettis, pommes de terre en sauce, jus de citron



Jour 16

Mardi 14 Mars

MÉTÉO

Soleil et nuages ! 30 °C

PROGRAMME

Au petit matin on retrouve l'équipe de nuit qui a très bien avancé sur la pose des solives !


Après le grand ménage du chantier et de la base vie hier, c'est au tour du magasin d'être réorganisé. On fabrique des étagères pour ranger proprement les outils en fonction des postes d'utilisation (plomberie, placo, électricité..).

Un des objectifs de la semaine est de coffrer, de couler et de mettre en place tous les appuis de fenêtres. C'est déterminée, qu'une équipe se met au travail pour atteindre cet objectif !

En parallèle du chantier, un bilan de santé est organisé par HUMAN'ISA pour tous les habitants de la communauté . Médecins et dentistes se retrouvent donc sur la place centralé pour ausculter les habitants, prodiguer des conseils d'hygiène et de soins, et prescrire des médicaments si nécessaire.

AU MENU

Riz, côtes de porc, jus d'ananas

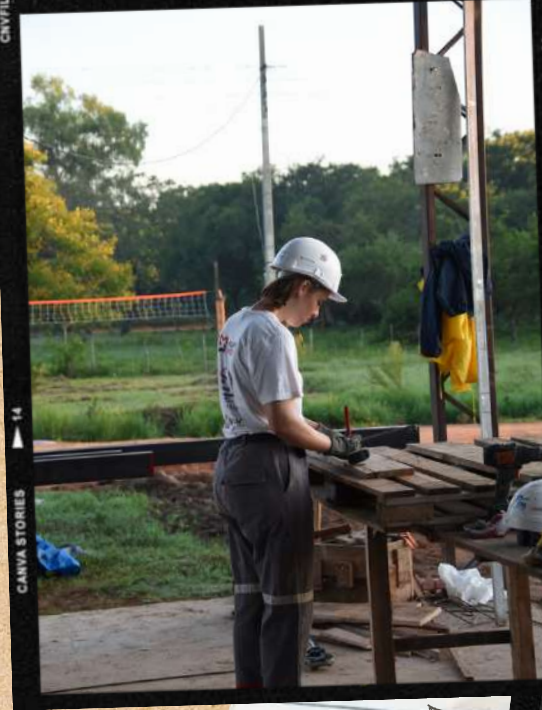

*A l'atelier, préparation
des coffrages d'appuis de
fenêtres*



Le bilan de santé



Jour 17

Mercredi 15 Mars

MÉTÉO

Nuageux et pluies tropicales ! 27 °C

PROGRAMME

Ça y est ! Les équipes d'électricité, plâtrerie, plomberie et VRD se créent, on entame le second œuvre ! Tout le monde est motivé malgré la météo capricieuse...

Aujourd'hui, on s'attaque à la pose de la couverture. Harnais de sécurité et lignes de vie sont de sortie. Nous avons posé 2/3 des panneaux sandwich.

La team élec se met au travail en installant les gaines tandis que la team soudure continue de créer la structure métallique du château d'eau.

Les fortes pluies ralentissent le groupe... tout le monde travaille avec sa parka, se réfugiant sous le hangar lorsque ça devient nécessaire.

La journée se termine au restaurant. Une grande partie du groupe s'y retrouve pour fêter la fin du gros œuvre !

AU MENU

Pâtes et boeuf en sauce, jus de melon



DÉBUT DE L'ÉLEC



POSE DE LA COUVERTURE



SOUDURE DE LA STRUCTURE DU CHÂTEAU D'EAU

Jour 18

Jeudi 16 Mars

MÉTÉO

Soleil et nuages ! 32 °C

PROGRAMME

En réalité, il manque encore quelques éléments maçonnés à réaliser. Les briques ne sont livrées qu'à 13h... (on les attendait pour 10h). La team maçonnerie s'attaque au montage du local poubelles et termine de combler les espaces entre les murs et la charpente métallique.

La team placo pose les suspentes et les rails pour le faux-plafond. Tout prend forme à une vitesse ! Pendant ce temps, la team VRD (Voirie et Réseaux Divers) termine les implantations pour le terrassement du futur parking.

La toiture avance, quelques panneaux sont posés et une partie du faitage est installée afin d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage.

C'est une journée bien productive car à 20h l'équipe élec a terminé d'installer toutes les gaines et de les nommer.

AU MENU

Salade de riz, poulet et jus de melon



*Pose de la
couverture au
lever du soleil*



Jour 19

Vendredi 17 Mars

MÉTÉO

Grand soleil ! 32 °C

PROGRAMME

Journée de repos pour 50 membres de l'association ! Ça fait du bien de se poser un peu ! Certains ont pris la route des chutes d'Iguazu, d'autres ont visité Asunción ou même Aregua.

Pendant ce temps sur chantier, on bâche toutes les ouvertures pour pouvoir installer le placo sans l'endommager.

Une équipe poursuit la pose des blocs au niveau du local poubelles. Dans les prochains jours nous pourrons y poser la toiture !

La pelle mécanique arrive et la team VRD (Voirie et Réseaux Divers) peut entamer le terrassement du futur parking.

À l'atelier, l'équipe de soudure avance vraiment bien sur la structure du château d'eau ! Ce sera la cerise sur le gâteau de notre projet.

La toiture est terminée et étanche, nous pouvons installer le faux plafond avec l'isolation ! Le bâtiment change d'allure nous sommes tous impressionnés.


AU MENU

Saladé (avocats, tomates, oignons), salade de pommes de terre et escalope



Aregua

Asunción

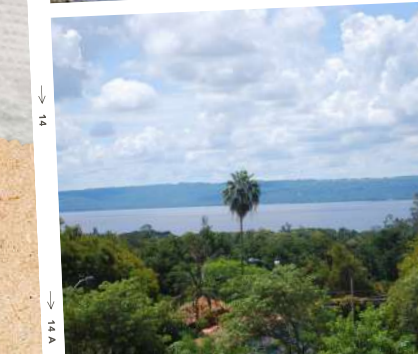

Jour 20

Samedi 18 Mars

MÉTÉO

Grand soleil ! 34 °C

PROGRAMME

Aujourd'hui, c'est le jour de repos de la seconde moitié du groupe. Encore une fois, on en profite pour visiter les alentours !

Le second œuvre motive les troupes ! On aimait bien monter des briques mais faire de l'électricité et poser les cloisons rend le bâtiment encore plus beau !

Les équipes se mettent en place.

Les rails et montants pour les cloisons sont presque tous installés à la fin de la journée. Les pièces se dessinent à vue d'œil.

Les premières canalisations sont posées en bordure du bâtiment et les premiers tuyaux de plomberie sont installés à l'intérieur.

On coule également la dalle recevant la structure métallique du château d'eau toujours en construction à l'atelier.

AU MENU

Pâtes, bœuf en sauce, salade et juse pamplemousse



PREMIÈRES CANALISATIONS



Jour 21

Dimanche 19 Mars

MÉTÉO

Grand soleil ! 30 °C

PROGRAMME

Dernier jour de la troisième semaine... le temps passe trop vite. Plus que 2 semaines avant l'inauguration, il n'y a pas de temps à perdre !

Tout le monde se met au travail.

En VRD, on remblaie les premières canalisations posées la veille et on coule les regards.

En placo, on termine la fixation de tous les rails et de tous les montants. La semaine prochaine on pourra fixer les plaques et passer toutes les gaines et tous les tuyaux !

En plomberie, on continue justement d'installer les réseaux intérieurs. Il faut bien bien forcer pour faire les raccords !

On se couche ce soir en ayant en tête que l'on se rapproche de la date de livraison du bâtiment. Il faut tout donner !

AU MENU

Salade de choux, escalope milanaise et jus de pamplemousse



Fin de la troisième semaine ! 😊

Un grand merci!

À TOUS NOS PARTENAIRES



